

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
«СОВРЕМЕННАЯ ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В
РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА»

13.11.2017 г.


г. Кызыл

1. Статус реализации
1.1. Общий статус реализации

Контрольные точки	Показатели	Бюджет	Иные проблемы и риски
<div data-bbox="156 320 339 450" style="background-color: green; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">53, исполнено- 33</div> <div data-bbox="148 495 341 629" style="background-color: red; color: white; padding: 5px;">8 с отклонения ми</div>	<p>1) Доля образовательных организаций, имеющих сайты, соответствующие действующему законодательству РФ- 79%, при плане на год 50%.</p> <p>2) Доля образовательных организаций, имеющих бесперебойный высокоскоростной доступ к сети Интернет, обеспеченный защитой от информации, не связанной с задачами образования- 90% при плане на год 90%.</p> <p>3) Доля образовательных организаций, работающих в штатном режиме в системе «Контингент»-62% при плане на год 60%, исполнено 100%</p> <p>4) Доля муниципальных органов управления образованием, работающих в системе электронного документооборота- 0% при плане на год 100%.</p> <p>5) Доля руководителей образовательных организаций, прошедших обучение работе в системе «Современная цифровая образовательная среда в Республике Тыва»- 50% на год 50%, исполнено 100%.</p> <p>6) Количество онлайн-курсов, обеспечивающих освоение дисциплин (модулей) образовательных программ среднего общеобразовательного, дополнительного образования, среднего профессионального образования, доступных для освоения в текущем году- 3 при плане на год 3 единицы.</p> <p>7) Число обучающихся по основным или дополнительным образовательным программам, прошедших обучение на онлайн-курсах для формального образования с получением документа, подтверждающего результаты обучения- 0 при плане 80 чел.</p> <p>8) Число обучающихся образовательных организаций, прошедших обучение на онлайн-курсах для формального и неформального обучения, чел., в том числе: – учащиеся общеобразовательных организаций, человек;- студенты профессиональных образовательных организаций, человек; - педагоги образовательных организаций, человек- 0 при плане на год 80 чел.</p>	Не освоен полностью	

1.2. Динамика достижения показателя


**Доля образовательных организаций,
работающих в штатном режиме в системы «Контингент»**

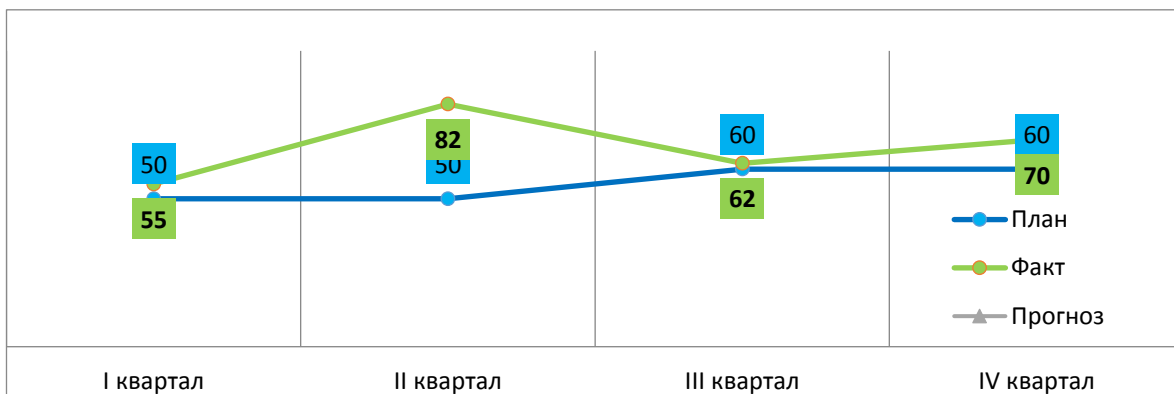

Доля образовательных организаций, имеющих бесперебойный высокоскоростной доступ к сети Интернет, обеспеченный защитой от информации, не связанной с задачами образования



Доля образовательных организаций, имеющих сайты, соответствующие действующему законодательству РФ



1.3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

№	с т а т у с	Наименование показателя (единица измерения)	Факт/прогноз				План овое значе ние на 2017 год	Комментарий
			I	II	III	IV		
1.		Число обучающихся образовательных организаций, прошедших обучение на онлайн-					В настоящее время разработаны программы.	

	курсах для формального и неформального обучения, чел., в том числе: – учащиеся общеобразовательных организаций, человек; – студенты профессиональных образовательных организаций, человек; – педагоги образовательных организаций, человек.	0	0	0	40	40	Определены пилотные учреждения. Приказ Минобрнауки РТ от 29 июня 2017 года №784-д «Об организации онлайн-образования».
2.	Число обучающихся по основным или дополнительным образовательным программам, прошедших обучение на онлайн-курсах для формального образования с получением документа, подтверждающего результаты обучения, человек.	0	0	0	20	20	
3.	Количество онлайн-курсов, обеспечивающих освоение дисциплин (модулей) образовательных программ среднего общеобразовательного, дополнительного образования, среднего профессионального образования, доступных для освоения в текущем году, единиц	0	0	0	3	3	
4.	Доля образовательных организаций, работающих в штатном режиме в системе «Контингент»	55/50	82/50	62/60	70/60	60	Приказ Минобрнауки РТ от 16.06.17 г. №719-д «О заполнении АИС «Электронная школа» Утверждён график. Начался новый учебный год, не заполнено в связи с тем, что не составлены планы, расписания.
5.	Доля муниципальных органов управления образованием, работающих в системе электронного документооборота	0	0	0	100	100	В настоящее время ожидают поставки оборудования.
6.	Доля образовательных организаций, имеющих бесперебойный высокоскоростной доступ к сети Интернет, обеспеченный защитой от информации, не связанной с задачами образования	80/80	80/80	80/85	90/90	90	Госконтракт по спутниковому каналу связи №Ф.2017.132995 ПАО «Ростелеком». ПАО «ТСИ» по наземному каналу связи скорость увеличена по сравнению с прошлым годом в 2 раза. Обеспечена контент-фильтрация информации на уровне провайдера – поставщиками интернета.
7.	Доля образовательных организаций, имеющих сайты, соответствующие действующему законодательству РФ	23/20	20/35	41/40	79/50	50	Проведен мониторинг сайтов ОО отделом ЦИТ. Было увеличено на 23% по заполняемости сайта.
8.	Доля руководителей образовательных организаций,	50	50	50	50	50	Проведены ряд семинаров для

	прошедших обучение работе в системе «Современная цифровая образовательная среда в Республике Тыва»							руководителей УО в течение января, февраля, марта, мая и 6 июля
--	--	--	--	--	--	--	--	---

1.4. Динамика исполнения контрольных точек



	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
плановое количество контрольных точек	3	5	11	15	22	24	27	31	37	41	44	53
фактическое количество пройденных контрольных точек	3	5	10	13	19	21	25	27	33	36		
прогнозное количество контрольных точек, которые по прогнозу будут исполнены в плановые сроки											44	53


Всего в рамках проекта должно быть пройдено за 2017 год 53 контрольные точки (мероприятий), с января по октябрь пройдено 36 мероприятий (%67) из 41 запланированных на конец октября (77%), 5 контрольные точки проходят с отклонением по срокам (9%). Главной причиной неисполнения в контрольные сроки является задержка финансирования.

1.5. Статус исполнения контрольных точек по функциональным направлениям за январь-октябрь 2017 г.

№	Функциональное направление	Всего контрольных точек	Статус	Прогноз
1.	Общие организационные мероприятия	5	5	

2.	Создание условий, обеспечивающих функционирование «Электронного министерства»	1	1		
3.	Работа с ГИС «Контингент»	10	6		4
4.	Регистрация доменов в зоне RU	2	2		
5.	Обеспечение доступа к системе электронного документооборота «Практика» МОУО, ДОУ, ОО, УДО, СПО	6	2	3	1
6.	Подключение 100% школ Республики бесперебойному и безопасному высокоскоростному интернету	2	2		
7.	Создание интернет-портала Министерства образования и науки Республики Тыва	3	3		
8.	Создание интернет-сайтов для ОО, ДОУ, МОУО, УДО, СПО, соответствующих действующему законодательству РФ	6	5		1
9.	Обучение сотрудников системы образования по работе с СЭД «Практика»	3	1		2
10.	Обучение сотрудников системы образования по работе с АИС «Контингент»	3	3		
11.	Обучение сотрудников системы образования по работе с сайтами	3	1		2
12.	Обучение сотрудников системы образования по безопасности Интернет	3	1		2
13.	Онлайн-обучение	6	4	2	
	Всего	53	36	3	12

1.6. Динамика исполнения бюджета проекта (млн. рублей)

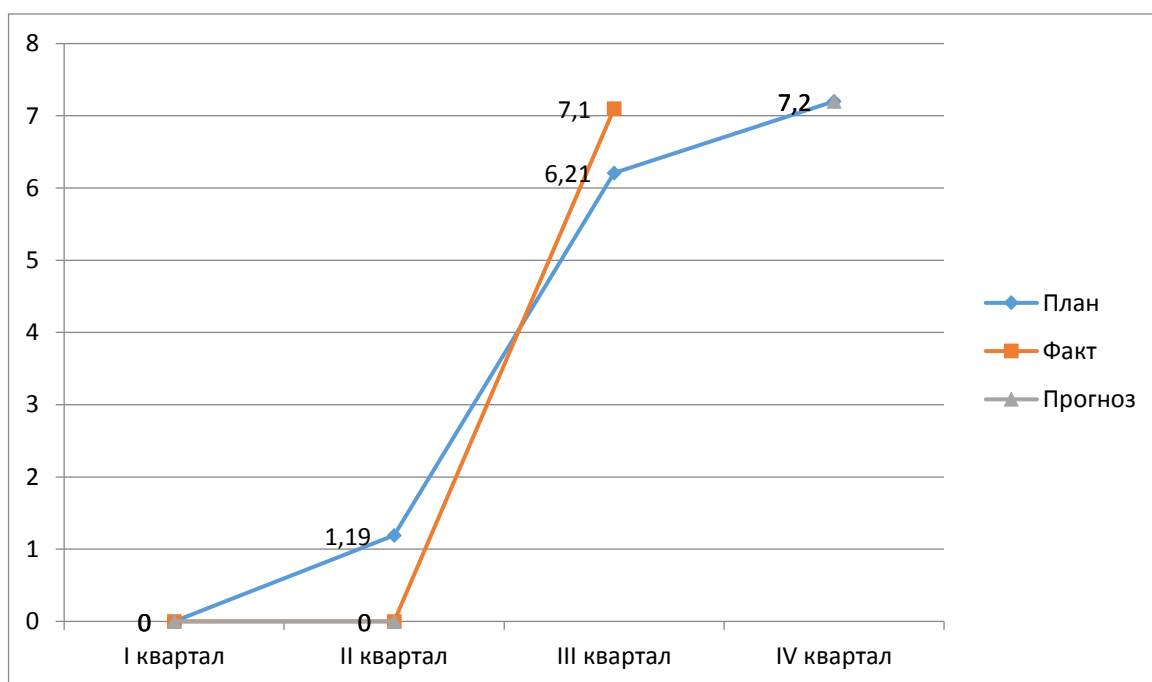

1.7. Статус исполнения бюджета проекта

	Год (квартально)					Всего по проекту
	I	II	III	IV	итого	
Бюджет проекта (план) млн.руб.	7,2	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	7,2	7,2

Бюджет проекта (факт/прогноз) млн. рублей	0,0/7,2	0,0/7,2	7,1/7,2	0,1/0,1	7,2/7,2	7,2/7,2
Отклонение	-7,2	-7,2	-0,1		7,2/7,2	7,2/7,2
Статус						

2. Сведения об исполнении контрольных точек

В графе указывается состояние точки выполнено, не выполнено, в работе.

№	Уровень контроля	С т а т у с	Наименование контрольной точки	Ответственный исполнитель	Дата исполнения		Комментарий	
					план	Факт/прогноз		
	Руководитель проекта		Утверждены паспорт и сводный план реализации проекта, определены источники и механизмы финансирования, сформирована рабочая группа проекта, определен нормативный статус информационной системы	Администратор проекта	30.01.	15.03	Паспорт разработан и утверждён, одобрен президиумом Совета при Главе РТ по стратегическому развитию и приоритетным проектам (программам), протокол от 15 марта 2017 г. № 1-пп/17	
1.			Разработка и утверждение паспорта проекта		30.02.	15.03.		
2.			Разработка сводного и рабочего планов проекта		30.01.	30.01		Сводный план проекта разработан
3.			Утверждение финансовых средств на реализацию проекта в рамках приоритизации расходов Минобрнауки Республики Тыва		30.01.	30.01.		
4.			Сформирована рабочая группа проекта и утвержден сводный план реализации проекта		30.01.	30.01.		
5.			Определены источники и механизмы финансирования проекта		27.02.	27.02.		
Созданы условия, обеспечивающие функционирование «Электронного министерства»								
6.	Руководитель проекта		Приобретено и введено в эксплуатацию оборудование для обеспечения функционирования Центра информационных технологий ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва» с целью реализации задач проекта	Администратор проекта	20.05.17	28.09.17	Исполнено с опозданием	
Работа с ГИС "Контингент"								
7.	Руководитель проекта		Работа с АИС "Электронная школа"	Администратор проекта, управления образования, школы, учреждения ДО, учреждения дошкольного	17.03.17	17.03.	Были проведены обучающие семинары для учителей школ по работе с АИС «Электронная школа» с 01.03 по 17.03.	
8.			Проведена информационно-разъяснительная работа по внедрению АИС «Электронная школа»					
			Осуществляется методическая и техническая поддержка по активизации работы с АИС «Электронная школа»		15.05.17	15.05.	Были проведены консультации для школ с проблемами в процессе	

			образования, учреждения СПО			работы с АИС «Электронная школа». Не активизировала работу с АИС «Электронная школа» школа села Шанчы из-за технических и организационных проблем
9.		Осуществляется методическая и техническая поддержка по организации работы по заполнению АИС «Электронная школа»		22.12.17		Ведутся консультации и даются советы в режиме реального времени по телефону, в группе Viber и в сети интернет.
		Работа с АИС "Электронное дополнительное образование"		20.12.19		
10.		Проведена информационно-разъяснительная работ по внедрению АИС «Электронное дополнительное образование»		17.03.17	20.03.	Были проведены обучающие семинары в период до 20 марта.
11.		Осуществляется методическая и техническая поддержка по активизации работы с АИС «Электронное дополнительное образование»		15.05.17	15.05.	Проведены консультации с отдельными учреждениями.
12.		Осуществляется методическая и техническая поддержка по организации работы по заполнению АИС «Электронное дополнительное образование»		22.12.17		
13.		Проведена информационно-разъяснительной работы по внедрению АИС «Электронный колледж»		17.03.17	17.03.	Были проведены обучающие семинары для сотрудников по работе с АИС «Электронный колледж».
14.		Осуществляется методическая и техническая поддержка по активизации работы с АИС «Электронный колледж»		15.05.17	15.05.	Были проведены консультации. Все учреждения среднего профессионального образования успешно активизировали работу с АИС «Электронный колледж».
15.		Осуществляется методическая и техническая поддержка по организации работы по заполнению АИС «Электронный колледж»		22.12.17		Ведутся консультации и даются советы в режиме реального времени по телефону и в сети интернет
		Работа с АИС "Электронный детский сад"		20.12.19		
16.		Осуществляется методическая и техническая поддержка по организации работы по заполнению АИС «Электронный детский сад»		22.12.17		Поддержка осуществляется.
		Домены зарегистрированы в зоне RU		07.04.17		
17.		Запущен сервер для хостинга портала Министерства образования и науки РТ		22.02.17	22.02.	Исполнено.
18.		В зоне RU зарегистрировано доменное имя		07.04.17	07.04.	Исполнено.

Обеспечение доступа к системе электронного документооборота «Практика» МОУО, ДОУ, ОО, УДО, СПО							
19.	Руководитель проекта		Подготовлено техническое задание для приобретения технического оборудования для сервера ЦИТ Минсвязи РТ для обеспечения работы системы электронного документооборота «Практика»	Администратор проекта	17.03.17	17.03.	Исполнено.
20.			Организовано проведение процедуры государственных закупок на приобретение и поставку технического оборудования для сервера ЦИТ Минсвязи РТ для обеспечения работы системы электронного документооборота «Практика»		31.03.17	Июль 2017	Исполнено с опозданием
21.			Установлено, протестировано и настроено техническое оборудование для сервера ЦИТ Минсвязи РТ для обеспечения работы системы электронного документооборота «Практика»		30.06.17	26.09.17	Исполнено с опозданием
22.			Запущен сервер и сформирована базы данных субъектов системы электронного документооборота «Практика»		25.08.17	20.11.17	В связи с опозданием при проведении государственных закупок перевод системы СЭД Практика с серверов Республики Татарстан на сервера Министерства информатизации и связи РТ будет ориентировочно закончен к концу октября. Запуск системы запланирован на 20.11.17
23.			Присвоены учетные данные субъектам системы электронного документооборота «Практика»		29.09.17	20.11.17	В связи с опозданием при проведении государственных закупок перевод системы СЭД Практика с серверов Республики Татарстан на сервера Министерства информатизации и связи РТ будет ориентировочно закончен к концу октября. Запуск системы запланирован на 20.11.17
24.			Выдача учетных данных субъектам системы электронного документооборота «Практика»		20.12.17		
100% школ Республики подключены к бесперебойному и безопасному высокоскоростному интернету							
	Руководитель проекта		100% школ Республики подключены к бесперебойному и безопасному высокоскоростному интернету	Администратор проекта	29.09.17		
25.			Обеспечен высокоскоростной доступ к Интернету		01.04.17	23.06	Контракты с провайдерами заключены с опозданием
26.			Настроен безопасный интернет в образовательных организациях для доступа к образовательным ресурсам интернет с помощью контент-фильтров		29.09.17	23.06	Разработаны меры по обеспечению безопасного интернета на уровне школы

							с помощью фильтрации по белому списку. Достигнута договоренность с ПАО «Тывасвязьинформ» по контент-фильтрации трафика на уровне провайдера (наземные каналы связи). Ведутся работы по обеспечению безопасного интернета с ПАО «Ростелеком» для школ, подключенных к интернету по спутниковым каналам связи.
Создан интернет-портал Министерства образования и науки Республики Тыва							
27.			Разработан проект структуры интернет-портала Министерства образования Республики Тыва в сети Интернет		16.05.17	16.05.	Исполнено
28.			Проведен сбор информации и материалов для интернет-портала Министерства образования Республики Тыва в сети Интернет		29.09.17	29.09	Исполнено.
29.			Информация и материалы размещены на локальной версии интернет-портала Министерства образования Республики Тыва		30.10.17	30.10.17	Исполнено.
Созданы интернет-сайты для образовательных организаций Республики Тыва соответствующих действующему законодательству РФ							
30.	Руководитель проекта		Разработана структура интернет-сайта Министерства образования и науки Республики Тыва	Администратор проекта, управления образования, школы, учреждения ДО, учреждения дошкольного образования, учреждения СПО	17.03.17	17.03.	Исполнено
31.			Разработаны шаблон и дизайн интернет-сайта Министерства образования и науки Республики Тыва		17.04.17	17.04.	Исполнено
32.			Произведен тестовый запуск и сбор материалов и наполнение интернет-сайта Министерства образования и науки Республики Тыва		25.05.17	30.05.	Произведен тестовый запуск Производится сбор необходимой информации в Министерстве образования и науки РТ. Запуск и дальнейшее функционирование запланировано на 30 мая 2017.
33.			Разработана структура интернет-сайта 177 школ Республики Тыва		26.07.17	26.07.	Исполнено.
34.			Разработаны шаблон и дизайн интернет-сайтов 177 школ Республики Тыва		29.09.17	29.09.17	Исполнено.
35.			Произведен тестовый запуск, проведен сбор материалов и наполнены интернет-сайта 177 школ Республики Тыва		15.12.17		
Сотрудники системы образования обучены работе с "Электронным министерством"							
36.			Разработаны программы обучения по работе с СЭД "Практика"		25.10.17	17.11.17	Задержка в связи с задержкой финансирования. Обучение будет проведено до 17.11.17

1.		Приобретено и введено в эксплуатацию оборудование для обеспечения функционирования Центра информационных технологий ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва» с целью реализации задач проекта (Приобретение тех оборудования и программного обеспечения для ЦИТ, расходы на Интернет)	Исполнитель проекта	I квартал	1,19	4250, 794 тыс. 653,2 тыс.	Заключен контракт с ООО «Барс Групп» на сопровождение ГИС «Контингент». На приобретение технического оборудования для ЦИТ
2.		Внедрение электронного документооборота	Исполнитель проекта	III квартал	630 тыс.	630 тыс	Закуплено и получено оборудование для электронного документооборота
3.		Создание интернет-портала Министерства образования и науки Республики Тыва и сайтов образовательных организаций Республики Тыва	Исполнитель проекта	III квартал	358 тыс.	385 тыс	Закуплено и получено оборудование для обеспечения работы сайтов школ.
4.		Повышение квалификации	Исполнитель проекта	III квартал	300 тыс.	200 тыс	Прошло обучение сотрудников курсу повышения квалификации VipNet Administrator версии 4
5.		Онлайн-обучение	Исполнитель проекта	IV квартал	990 тыс.	990 тыс	На приобретение программ обеспечения для организации в системе видео- конференц связи, онлайн-обучения.
		Итого:			7, 2	7,1	

4. Наличие иных проблем и рисков

№	Статус	Направление	Проблемы/риск	Предлагаемые решения
1.		Реализация всех направлений	Задержка финансирования может привести к задержке реализации направлений, требующих финансовых вложений, таких как внедрение СЭД «Практика», разработка портала и сайтов, и т.д.	Своевременное финансирование
